



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202130001228

Fecha Radicación: 2021/09/23

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **MONICA PATRICIA OSPINA LONDOÑO**
Directora General

LUIS ALBERTO COLORADO ALDANA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

DE: **ADRIANA BELLO CORTÉS**
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: *Informe de seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión del Instituto.*

1. Objetivo

Realizar seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión a cargo del Instituto, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 2.2.21.3.4. del Decreto 1083 de 2015, que indica que la Oficina de Control Interno debe evaluar el proceso de planeación en toda su extensión, que para este caso se dirige a identificar el estado de avance de los proyectos e identificar oportunidades de mejora que puedan ser aplicadas para su ejecución y seguimiento.

2. Alcance

Se realizó revisión de la información de ejecución de los proyectos de inversión a cargo del Instituto desde enero 01 hasta junio 30 de 2021.

Se analizó la información de ejecución del Presupuesto, Plan de Acción Institucional y Plan Anual de Adquisiciones con corte a agosto 30 de 2021.

3. Normatividad

Los referentes normativos que se han tenido en cuenta para esta evaluación son los siguientes:

- Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.3.4.
- Circular 0008-4 de febrero de 2021 del Departamento Nacional de Planeación (DNP)



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

4. Metodología

Durante el desarrollo del seguimiento se utilizaron los siguientes mecanismos para la obtención y análisis de información:

- Verificación de información de ejecución de los recursos de inversión, a través de la revisión de los datos de ejecución del presupuesto, plan de acción y plan anual de adquisiciones.
- Revisión de la información disponible en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tal como se evidencia en la siguiente imagen:

Vigencia: Período: Financiación:

Sector: Económico Presupuestal

Entidad: Responsable Ejecutora

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Empresas	3	\$53.693.618.041	5,1%	0,7 %	7,4 %	Ver
TOTAL	3	\$53.693.618.041	5,1%	0,7 %	7,4 %	

Evolución Avance: ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) de la Inversión SPI - Junio 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión*	0	53.694	53.694	53.694	53.694	53.694
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	3,6%	5,1%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión DNP.

5. Resultados del Seguimiento

5.1. Presupuesto de Inversión

El presupuesto de inversión del Instituto para la vigencia 2021 asciende a la suma de \$53.950.041.233, según lo establecido en la Resolución Interna No. 000001 del 4 de enero de 2021, por la cual se efectúa la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes para la vigencia fiscal 2021, tal como se evidencia en la siguiente imagen:



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

OBJETO DE GASTO	GASTOS CAUSADOS	CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DE GASTOS 2021
INVERSIÓN	\$ 53.790.314.344,00	\$ 159.726.889,00	\$ 53.950.041.233,00
INV Fortalecimiento del plan de tecnología de la información y las comunicaciones en el Icfes	\$ 4.713.244.303,00	\$ 159.726.889,00	\$ 4.872.971.192,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.713.244.303,00	\$ 159.726.889,00	\$ 4.872.971.192,00
INV Fortalecimiento del servicio de evaluación de la educación realizado por el Icfes	\$ 5.887.944.044,00	-	\$ 5.887.944.044,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.072.858.692,00	-	\$ 5.072.858.692,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 815.085.352,00	-	\$ 815.085.352,00
INV Fortalecimiento Institucional del Icfes	\$ 43.189.125.997,00	-	\$ 43.189.125.997,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 43.189.125.997,00	-	\$ 43.189.125.997,00

<https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2111566/Resolucion%200001%20del%2004%20de%20enero%20de%202021.pdf>

Cabe precisar que mediante la Resolución 0022 del 11 de agosto de 2021 del Ministerio de Hacienda se modificó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES para la vigencia fiscal de 2021. La mencionada modificación al presupuesto del Icfes fue la siguiente:

RESUELVE:		PRESUPUESTO DE GASTOS	
125 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - E. S. E.		Operación Comercial	\$16.514.398.903
		TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$16.514.398.903
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Operación Comercial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- Empresa Social del Estado, así:		ARTÍCULO SEGUNDO: Modifícase el Presupuesto de Gastos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, Empresa Social del Estado así:	
ADICIÓN		CONTRACRÉDITO	
PRESUPUESTO DE INGRESOS		INVERSIÓN	\$33.686.779.009
INGRESOS CORRIENTES	\$16.514.398.903	TOTAL CONTRACRÉDITO	\$33.686.779.009
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$16.514.398.903	CRÉDITO	
		OPERACIÓN COMERCIAL	\$10.795.440.092
		DISPONIBILIDAD FINAL	\$22.891.338.917
		TOTAL CRÉDITO	\$33.686.779.009

Por lo indicado, el presupuesto de inversión se redujo a \$20.263.262.224, tal como se evidencia a continuación:

OBJETO DE GASTO	APROPiación VIGENTE	ADICIÓN	CONTRACRÉDITO	CRÉDITO	APROPiación FINAL
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 53.950.041.233	\$ -	\$ 33.686.779.009	\$ -	\$ 20.263.262.224
INV FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE TECNOLOGÍA, DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL ICFES	\$ 10.215.263.396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.215.263.396
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 10.215.263.396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.215.263.396
INV FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN REALIZADO POR EL ICFES	\$ 7.508.627.705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.508.627.705
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.693.542.353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.693.542.353
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 815.085.352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 815.085.352
INV FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ICFES	\$ 36.226.150.132	\$ -	\$ 33.686.779.009	\$ -	\$ 2.539.371.123
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 36.226.150.132	\$ -	\$ 33.686.779.009	\$ -	\$ 2.539.371.123
TOTAL GASTOS	\$ 169.384.194.244	\$ 16.514.398.903	\$ 33.686.779.009	\$ 10.795.440.092	\$ 163.007.254.230
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 11.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.891.338.917	\$ 33.891.338.917
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 180.384.194.244	\$ 16.514.398.903	\$ 33.686.779.009	\$ 33.686.779.009	\$ 196.896.593.147

<https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2111566/Resolucion%2000022%20del%2011%20de%20agosto%20de%202021.pdf>

5.2. Proyectos de Inversión

Una vez consultada la información disponible en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se encuentran los siguientes datos respecto a los proyectos



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

de inversión del Instituto. Por parte de la Oficina de Control Interno se realizaron consultas al 30 de julio de 2021 y a 30 de agosto de 2021, esta última con los siguientes avances:

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Empresas	3	\$53.693.618.041	6,1%	0,7 %	7,4 %	Ver
TOTAL	3	\$53.693.618.041	6,1%	0,7 %	7,4 %	

Evolución Avance: ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)
de la Inversión SPI - Julio 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Inversión*	0	53.694	53.694	53.694	53.694	53.694	53.694
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	3,6%	5,1%	6,1%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	7,4%

*Cifra en millones de pesos

Vigencia: 2021 | Período: Agosto | Financiación: (Todas)

Sector: Educación | Económico Presupuestal

Entidad: ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR () | Responsable Ejecutora

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Empresas	3	\$20.006.839.032	20,8%	18,7 %	1,4 %	Ver
TOTAL	3	\$20.006.839.032	20,8%	18,7 %	1,4 %	

Fuente: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

Al respecto, se evidencia que el porcentaje de avance financiero reportado a agosto 30 es del 20.8% y el avance físico es del 19% a la misma fecha, tal como se detalla a continuación:




202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

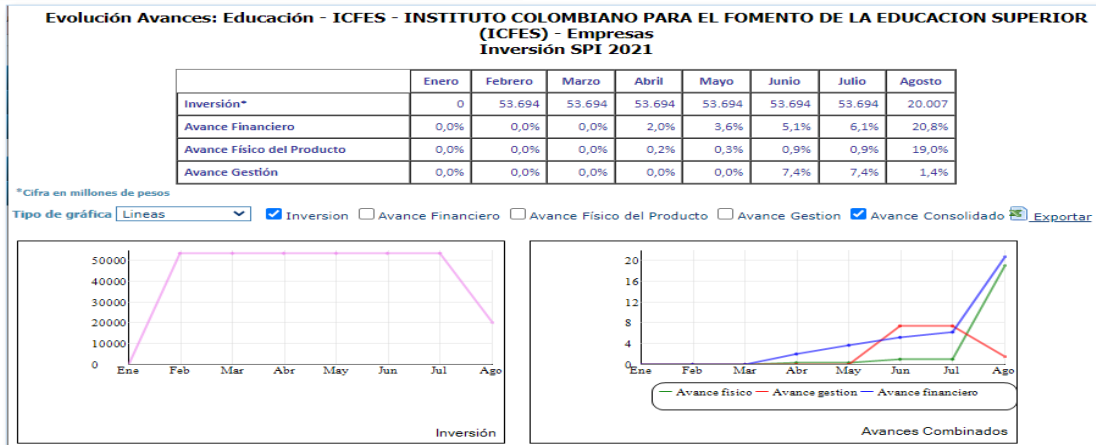

Fuente: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

Los recursos financieros arriba indicados corresponden a tres (3) proyectos de inversión:

Sector Educación			
Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
ICFES	2021019990002	Fortalecimiento del plan de tecnología de la información y las comunicaciones en el Icfes	17,72 %
ICFES	2021019990003	Fortalecimiento Institucional del Icfes	14,58 %
ICFES	2021019990004	Fortalecimiento del servicio de evaluación de la educación realizado por el Icfes	26,91 %

No. Proyectos 3

1) Proyecto - Fortalecimiento del plan de tecnología de la información y las comunicaciones en el Icfes

Código BPIN: 2021019990002

Sector: Educación

Entidad: Icfes

Responsable: Dirección de Tecnología e Información

Horizonte: 2021 – 2021

Presupuesto 2021: \$9.968.987.522

Control Posterior: N/A

Seguimiento de: agosto 2021

Objetivo del proyecto: Mejorar la disponibilidad y uso de las soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones para soportar y mejorar la operación de los procesos del Icfes

Presupuesto 2021: \$9.968.987.522

Compromisos a agosto 30: \$ 3.084.612.606

Obligación a agosto 30: \$ 1.214.740.169

Pagos a agosto 30: \$1.214.740.169

Comparativo avances agosto 2021-julio 2021

Avance físico agosto 2021: 7%

Avance físico Julio 2021: 0%

Avance financiero Agosto: 17,72%

Avance físico julio: 15%

Avance gestión Agosto: 0%

Avance gestión julio: 0%



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

El cumplimiento promedio de las metas proyectadas a agosto de 2021, en términos de avance físico (productos) es del 7%, mientras que el avance financiero que se encuentra en un 17,72%.

Fuentes de Financiación

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Vigente	Vigente Con Aplazamiento	Compromiso	Obligación	Pago
Empresas públicas	Icfes - Instituto Colombiano Para El Fomento De La	Propios	9.968.987.522	0	3.769.109.739	1.766.531.805	1.766.531.805
		Total Proyecto	9.968.987.522	0	3.769.109.739	1.766.531.805	1.766.531.805
		Total	9.968.987.522	0	3.769.109.739	1.766.531.805	1.766.531.805

Para el cumplimiento de este proyecto se tienen planteados dos objetivos específicos con actividades y productos que se describen a continuación:

Objetivo Específico	Producto	Indicador de producto	Unidad Medida	Meta 2021	Meta agregada	Avance junio*	% avance
Mejorar la capacidad de soporte de la infraestructura tecnológica de la entidad	2299066 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100%	100%	28%	28%
Facilitar la accesibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información	2299062 - Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	Numero	3	2	0,46	23%
			Numero		1*	0,42	
	2299063 - Servicios de información Implementados	Sistemas de información Implementados	Numero	1	1	0	0%

Para el presente informe se ha tenido en cuenta los registros de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, según el cumplimiento de actividades, así:



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

OBJETIVO ESPECIFICO	AVANCES
Mejorar la capacidad de soporte de la infraestructura tecnológica de la entidad	<p>A junio de 2021 se reporta el 28% de las actividades estratégicas de servicios tecnológicos, sustentadas en los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación planeación modelo de Atención y Operación de Servicios de TI - Lineamientos para mesa de servicio, soporte técnico y los ANS para la operación en catálogo de servicios - Datos corregidos y revisados versus datos de la RNEC - Informes de seguimiento y afinamiento herramientas (DLP, Seguridad Office 365, WAF, Imperva, Antivirus, DDOS, DA, VPN, Correlacionador de eventos) - Registro de seguimiento de incidentes de SI - Datos corregidos y revisados versus datos de la RNEC - Documento de lineamientos necesarios para el cargue y validación de información de String de respuestas (plexi-operador-Misional).
Facilitar la accesibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información	<p>Se presenta un avance del indicador de 0,46 en la gestión de actualización de sistemas de información por mantenimientos o parametrización, los cuales se sustentan en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscripción para eliminar la obligatoriedad de la resolución de novedades con SIMAT en el proceso de inscripción de colegios Saber 11. Versión del módulo de inscripción 1.9.5 - Servicio que gestiona la lógica de negocio para la validación de la identidad de una persona, teniendo en cuenta validaciones con fuentes oficiales - Reglas de gestión de datos personales en los procesos de gestión y autogestión. - Versión del módulo de inscripción para dar soporte a la diferencia tarifaria definida en la resolución 575 para población individual que presenta Saber 11 en repetidas ocasiones y ajustes en las reglas de la pestaña de Matricula SIMAT - Versión del nuevo módulo de resultados para el reporte Saber 11 planteado con el fin de facilitar la usabilidad del reporte. - Versión del módulo de inscripción de estudiantes a colegios con convenios con las Secretarías de Educación. Adicionalmente, ajustar el módulo de inscripción para actualizar la sección de políticas de privacidad, cambios en el formulario de inscripción - Certificación de pruebas funcionales de integración Plexi con un fabricante de herramientas de proctoring. - Acta de demostración funcionalidad Pre validación de armado en Aprovisionamiento electrónico banco. - Acta de demostración funcionalidad Configuración examen en Aprovisionamiento electrónico configuración. - Acta de demostración nuevas funcionalidades Preguntas abierta en Aprovisionamiento electrónico configuración - Acta de demostración funcionalidad Preguntas dudosas en Aprovisionamiento electrónico banco. - Acta de demostración funcionalidad de Activación e inactivación de usuarios en Plexi. - Acta de certificación de nuevas funcionalidades en Plexi - Plan de trabajo y costeo de los proyectos Evaluar para Avanzar 3 a 11 y Saber 3579. <p>Módulo de inscripción Evaluar para Avanzar 3 a 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de información requerida de acuerdo necesidades establecidas por las áreas del instituto y/o los anexos técnicos especificados para el trimestre 1 - Entrega de información a entidades con las cuales se tiene convenio de acuerdo a los requerimientos detallado de los anexos técnicos para el trimestre 2. - Solicitud de información requerida de acuerdo necesidades establecidas por las áreas del instituto y/o los anexos técnicos especificados para el trimestre 2. - Especificación de mantenimientos sobre los servicios de acuerdo a nuevas necesidades o problemas reportados para los servicios de recaudo. - Documento de Especificación de Servicios para PSE. - Tableau <p>A junio se presenta avance del indicador al 0,46 con una meta de 3 sistemas de información actualizados, de sistemas de información a nivel correspondientes a los proyectos estratégicos de la DTI. Los avances se sustentan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista de chequeo de requerimientos del portal web. - Mapa de navegación portal web Icfes - TDR's - Especificación técnicas y funcionales para implementación <p>La planeación contempla reporte hasta el tercer trimestre</p>

Fuente: Reporte Oficina Asesora de Planeación.

2) Proyecto – Fortalecimiento Institucional del Icfes.

Código BPIN: 2021019990003**Sector:** Educación**Entidad:** Icfes**Responsable:** Secretaría General- Oficina Asesora de Planeación – Oficina Control Interno – Unidad Atención al Ciudadano**Horizonte:** 2021-2021**Presupuesto 2021:** \$2.535.871.123**Control Posterior:** N/A**Seguimiento de:** agosto 2021**Objetivo del proyecto:** Fortalecer la capacidad institucional para cumplir con los objetivos y servicios de la Entidad.

Presupuesto 2021: \$2.535.871.123

Compromisos a agosto 30: \$1.748.071.502

Obligación a agosto 30: \$ 369.767.511

Pago a agosto 30: \$ 369.767.511



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

Comparativo avances agosto 2021-julio 2021

Avance físico agosto 2021:	31%	Avance físico Julio 2021:	1%
Avance financiero agosto:	14,58%	Avance financiero julio:	0,82%
Avance gestión agosto:	11%	Avance gestión julio:	11%

El cumplimiento promedio de las metas proyectadas a agosto de 2020, en términos de avance físico (productos) es del 31%, lo cual evidencia la ejecución parcial de las actividades en lo corrido de la vigencia. Así mismo, el avance financiero es importante revisarlo ya que reporta un 14%.

Fuentes de Financiación

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Vigente	Vigente Con Aplazamiento	Compromiso	Obligación	Pago
Empresas públicas	Icfes - Instituto Colombiano Para El Fomento De La	Propios	2.535.871.123	0	1.748.071.502	369.767.511	369.767.511
		Total Proyecto	2.535.871.123	0	1.748.071.502	369.767.511	369.767.511
		Total	2.535.871.123	0	1.748.071.502	369.767.511	369.767.511

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen planteadas dos actividades o productos que se describen a continuación:

Objetivo Específico	Producto	Indicador de producto	Unidad Medida	Meta 2021	Meta 2021 agregada	Avance Junio	% Avance
Fortalecer la capacidad de gestión de la infraestructura física y administrativa	2299067 Estudios de pre-inversión	Estudios de pre-inversión	Numero	1	SAySG	0	0%
	2299011 Sede adecuadas	Sedes adecuadas	Numero	1	SAySG	0	0%
	2299015 Sedes adquiridas	Sedes adquiridas	Numero	1	SAySG	0	0%
	2299052 Servicio de gestión documental	Procesos implementados	Numero	58%	SAySG	12%	21%
Mejorar capacidad de gestión organizacional	2299054 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Numero	1	OAP	40%	40%
	2299055 Documentos metodológico	Documentos realizados	Numero	1	OACyM		
	53 - Documentos de lineamientos técnicos	Documentos realizados	Numero	0	UAC		
				1	OCI	25%	25%

Fuente: Reporte Oficina Asesora de Planeación.

Para el presente informe se ha tenido en cuenta los registros de seguimiento de la OAP, según el cumplimiento de actividades, así:



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

OBJETIVO ESPECIFICO	AVANCES
	<p>Ala fecha no se han realizado los estudios y diseños para la intervención del edificio ubicado en las aguas, se solicito concepto de norma a la Secretaría de Planeación Distrital.</p> <p>Se han adelantado gestiones de administración de inmuebles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagos de cuotas extraordinarias en los inmuebles del edificio angel. 2. Atención de emergencias en el predio del edificio las aguas. 3. Supervisión al inmueble arrendado en el edificio Elemento.
	<p>Como trazabilidad, se cuenta con informe realizado por Taliesim en el año 2019 sobre las posibilidades de intervención que tiene la sede del Centro. Por su parte, el pasado 06 de abril de 2021, El Ministerio de Cultura Aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá PEMP - CHB, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, mediante la resolución 0088 de 2021, "Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro".</p>
	<p>Ahora bien, el recurso apropiado por este rubro entra en la modificación presupuestal en curso solicitando el ajuste de la meta y contracrédito de los recursos, quedando en "0", se espera la aprobación por parte del MHCP.</p>
	<p>Este proceso no fue autorizado por la Alta Dirección del Icfes, por lo cual es necesario liberarlo del PAA-2021 e iniciar su proceso de retiro del presupuesto (Plan Anual de adquisiciones), dada su cuantía.</p>
	<p>Solicitud 8: De la línea 77 realizar la liberación de los recursos que ascienden a \$32.662.166.770. se realiza retiro a través del acta 14 de 2021 de Modificaciones del PAA.</p>
	<p>Ahora bien, el recurso apropiado por este rubro entra en la modificación presupuestal en curso solicitando el ajuste de la meta y contracrédito de los recursos, quedando en "0", se espera la aprobación por parte del MHCP.</p>
	<p>Se ha avanzado en un diagnóstico del estado actual de al gestión documental, dentro del nuevo plan de trabajo 2021_2022, además, se dispone del proyecto de mapa de riesgos para actualizar los vinculados en DARUMA.</p>
	<p>Se culminó la actualización de la Política de Gestión Documental, el PGD y el PINAR, documentos que estan listos para ser presentados en el próximo Comité Administrativo de Desarrollo y Desempeño, se avanza en la elaboración de los procedimientos que contemplan los 8 procesos de la Gestión Documental y continua en proceso la actualización y ajuste de las TRD</p>
	<p>Plan de trabajo para la implementación de la AE en la entidad Análisis cualitativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo elaborado 2. Acompañamiento a la dirección del Icfes en la planeación 2021 3. Avance en diagnóstico y determinar mejoras en pruebas electrónicas 4. Avance en plan de acompañamiento OAP a SABER 11A y una prueba de evaluación desde la Arquitectura Empresarial. 5. Concern costos: Levantamiento y análisis de información financiera de asignación de ingresos, costos y gastos asignados a las pruebas. Ejecución de ejercicio de marco lógico para diagnóstico y determinar mejoras en costo de las pruebas: Definición del problema y grupos de Interés. 6. Concern Atención al ciudadano (PQRS): Levantamiento de información, análisis de datos de PQRS. Desarrollo de herramienta de análisis de datos en Excel. 7. Acompañamiento OAP a pruebas: Desarrollo del cronograma de pruebas para considerar en el acompañamiento de la OAP a las pruebas. 8. Planview: Contratación Planview para ejercicios de AE. Identificación de preguntas de negocio para concern Costos
	<p>Las actividades se proyectar realizar en el 2 semestre</p>
	<p>En revisión necesidad, con proyección de traslado de recurso del producto de sedes adecuadas</p>
	<p>1) Se han desarrollado seis (6) entrevistas a diferentes colaboradores de diferentes áreas (direcciones) del ICFES. El objetivo de las mismas, fue el entendimiento de la auditoría, los puntos clave a revisar, para determinar fortalezas y oportunidades de mejora.</p>
	<p>Recolección documental:</p>
	<p>1) En la primera etapa de la auditoría, descrita en el plan de auditoría, se describe hacer la recolección documental de información y documentos que permitan entender el proyecto de la auditoría.</p> <p>a) Documentos a la dirección de tecnología: Esta información contiene datos relevantes del proceso y software utilizado, en las pruebas electrónicas Saber TyT y PRO.</p> <p>b) Documentos solicitados a la dirección de producción y operaciones. Esta dirección es la encargada de ejecutar el proyecto, tanto en logística (transporte) como lo que ocurre el día de la prueba. La documentación solicitada hace referencia a los procesos y procedimientos que esta dirección hizo en las pruebas electrónicas Saber TyT y Sabe PRO en el años 2020.</p> <p>c) Copia de los contratos adjudicados para el desarrollo de estas pruebas, se revisarán las matrices de riesgo y los anexos técnicos de cada uno.</p>

Fuente: Reporte Oficina Asesora de Planeación.

3) Proyecto - Fortalecimiento del servicio de evaluación de la educación realizado por el Icfes

Código BPIN: 2021019990004

Sector: Educación

Entidad: Icfes

Responsable: Dirección de Evaluación - Dirección de Producción y Operaciones

Horizonte: 2021-2021

Presupuesto 2021: \$7.501.980.387

Control Posterior: N/A

Seguimiento de: agosto 2021

Objetivo del proyecto: Contar con suficientes insumos y elementos para el diseño de las pruebas de evaluación.

Presupuesto 2021: \$ 7.501.980.387

Compromisos a agosto 30: \$5.180.297.895

Obligación a agosto 30: \$2.018.569.743



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603

Pago a agosto 30: \$2.018.569.743



La educación es de todos

Mineducación

Comparativo avances agosto 2021-julio 2021

Avance físico agosto 2021:	30%	Avance físico Julio 2021:	0%
Avance financiero agosto:	26,91%	Avance financiero julio:	19%
Avance gestión agosto:	0%	Avance gestión julio:	0%

El cumplimiento promedio de las metas proyectadas a agosto de 2020, en términos de avance físico (productos) es del 0.0%, lo cual evidencia que no se han desarrollado las actividades, sin embargo, el avance financiero presenta un avance del 26%, por tanto, es conveniente su revisión.

Fuentes de Financiación

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Vigente	Vigente Con Aplazamiento	Compromiso	Obligación	Pago
Empresas públicas	Icfes - Instituto Colombiano Para El Fomento De La	Propios	7.501.980.387	0	5.180.297.895	2.018.569.743	2.018.569.743
		Total Proyecto	7.501.980.387	0	5.180.297.895	2.018.569.743	2.018.569.743
		Total	7.501.980.387	0	5.180.297.895	2.018.569.743	2.018.569.743

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen planteadas dos actividades o productos que se describen a continuación:

Objetivo Específico	Producto	Indicador de producto	Unidad Medida	Meta 2021	Meta desagregada por dependencias	Dependencias	Avance junio	% Avance
Contar con suficientes insumos y elementos para el diseño de las pruebas de evaluación	2299070 Documentos de evaluación	Instrumentos de evaluación construidos	Porcentaje	100%	100%	DE (SDI)	0	0
	2299055 Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	Numero	1	1	DE	N/A	N/A
	2299053 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Numero	5	3	DE	0	0
					2	DPO	0	0

Para el presente informe se ha tenido en cuenta los registros de seguimiento de la OAP, según el cumplimiento de actividades, así:



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación es de todos

Mineducación

OBJETIVO ESPECIFICO	AVANCES
Contar con suficientes insumos y elementos para el diseño de las pruebas de evaluación	El resultado esperado en la meta para el mes de junio es de 0%. Lo anterior, teniendo en cuenta que las actividades relacionadas se encuentran en etapa de convocatoria y contratación de equipos de trabajo por parte del proveedor externo. Además que, por definición de metas del indicador se espera reportar hasta el tercer trimestre de la vigencia, una vez se materialicen las acciones contempladas. Dicho resultado se encuentra alineado con lo establecido en el plan de acción del área.
	No aplica, los resultados se contemplan ejecutar en el ultimo cuatrimestre de la vigencia.
	La Subdirección de Análisis y Divulgación se encuentra desarrollando el informe de resultados de SSES para la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Finalizando el mes de junio presentaron la propuesta interna y externa, se espera que en septiembre que se hace el lanzamiento oficial de los resultados de SSES, se pueda entregar este reporte a la SED finalizado. Por el momento el mismo está en proceso.
	Se realizó evaluación frente a la continuidad de las pruebas frente a la situación de orden publico en el territorio nacional, se comunica al consorcio la situación y se define que para efectos de garantizar la aplicación de las pruebas PISA y CIVICA con las coberturas exigidas para la medición, las pruebas deben ser suspendidas. en este sentido, se le informa al operador la suspensión del contrato, la cual se oficializa el día 17 de junio de 2021.

Fuente: Reporte Oficina Asesora de Planeación.

Es importante precisar que el Instituto, en su calidad de Empresa Social del Estado, no forma parte del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la Circular 0008-4 de febrero de 2021 expedida por el DNP, se establecen los criterios y el procedimiento para el seguimiento a la ejecución presupuestal de la inversión pública de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), de las Sociedades de Economía Mixta (SEM) con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.

Por tanto, a partir del segundo semestre de 2021 las EICE registran sus proyectos en el Banco Único de Proyectos de Inversión Nacional compuesto por los sistemas de información MGAWEB, SUIFP y el SPI.

Adicionalmente, los proyectos formulados en el primer semestre continuarán registrando la información de seguimiento en el SPI, manteniendo el proceso que actualmente se realiza para los proyectos en ejecución.

5.3. Ejecución de contratos del Plan Anual de Adquisiciones asociados a los proyectos de inversión

Una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones – agosto vigencia 2021, publicado en la sección de Transparencia de la página web del Instituto, <https://www.icfes.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones>, no resulta posible conciliar cada uno de los valores de las contrataciones asociadas a los recursos de inversión de la Entidad, ya que el plan publicado está a nivel general o agregado. Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por la Oficina Asesora de Planeación, se puede evidenciar el detalle de las contrataciones, de las vigencias futuras (cuando aplican), de los gastos por GMF, así como las cuentas por pagar, entre otros conceptos. No se tienen observaciones al respecto.



202130001228

Fecha Radicado: 2021-09-23 14:31:39.603



La educación
es de todos

Mineducación

6. Fortalezas

Como resultado del seguimiento realizado se determinan las siguientes fortalezas:

1. La información básica sobre la planeación y ejecución presupuestal del Instituto se encuentra publicada en su página web, tal como lo exige la Ley 1712 de 2014 y la Oficina Asesora de Planeación dispone de los datos actualizados sobre planeación y ejecución de recursos, según pudo evidenciarse en entrevista de auditoría.
2. El Icfes ha dado cumplimiento a la Circular 0008-4 de febrero de 2021 del Departamento Nacional de Planeación, referente a la aplicación de los criterios y el procedimiento para el seguimiento a la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión. La mencionada circular establece el deber de reportar mensualmente los avances de los proyectos de inversión en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI del DNP, tal como pudo evidenciarse.

7. Oportunidades de Mejora

Como resultado del seguimiento realizado, se formulan las siguientes recomendaciones para la mejora permanente de la gestión de los recursos de inversión:

1. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan dar cumplimiento a lo descrito dentro del Plan de Acción Institucional 2021, en lo correspondiente a la ejecución de las actividades de los tres proyectos de inversión. Lo señalado, considerando que con corte a agosto 30 los porcentajes de ejecución física y financiera de los tres proyectos son bajos y restan pocos meses para el cierre de la vigencia. Se entiende que ha habido cambios en la planeación de los proyectos y en el total de recursos disponibles, lo cual ha afectado el normal ritmo de ejecución.
2. Se sugiere a los líderes de los tres proyectos de inversión realizar una revisión de las actividades programadas para lo que resta de la vigencia 2021 y avanzar significativamente en su ejecución y oportuno reporte, para que al finalizar la vigencia tanto los avances físicos como los financieros sean satisfactorios.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Claudia Marcela Huertas V., Omar Urrea Romero.

Revisó: Adriana Bello Cortés

Aprobó: Adriana Bello Cortés
